週　間　工　程　表

工　事　名　：　R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事
工 事 場 所：　埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先
工　　期：　令和4年12月12日　～　令和5年12月28日

提 出 年 月 日　　令和 5年 7月 4日
受　注　業　者　　戸田道路株式会社
現 場 代 理 人　　安村　浩樹

月　日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定							備　考
	6月					7月																							
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工																										埋設探査			
										事前測量						仮置場整備	仮置場整備	仮置場整備	仮囲い設置			仮囲い設置	残土受入地整備	残土受入地整備	残土受入地整備				
立会・確認打合せ等					14:30 施工前確認	休み	休み						休み	休み						休み	休み						休み	休み		計画
場所・時間																													実施
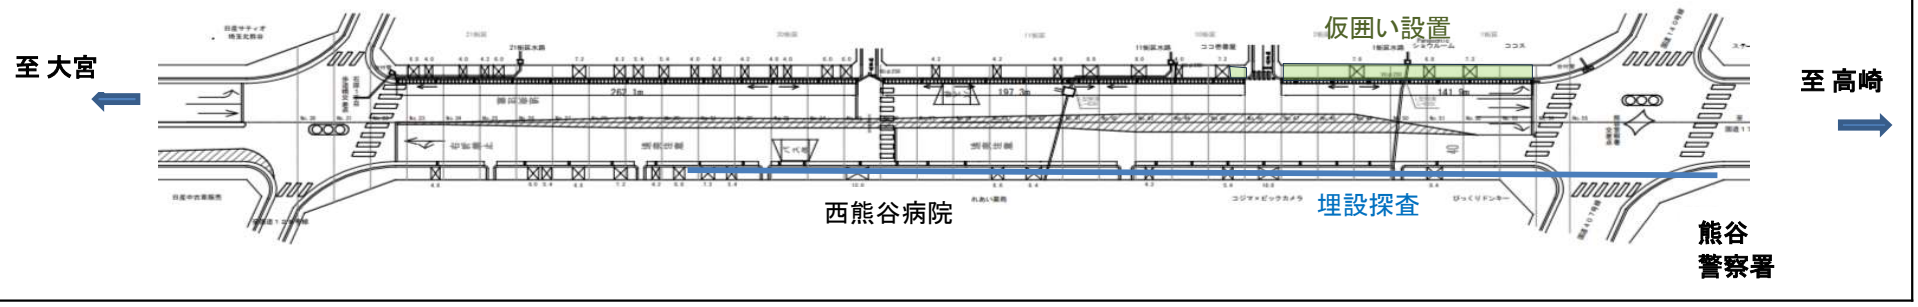
【摘要欄】
