週　間　工　程　表

10

工　事　名　：　R4国道17号熊谷(3)路面復旧他工事
工 事 場 所：　埼玉県熊谷市石原三丁目～埼玉県熊谷市石原地先
工　　期：　令和4年12月12日　～　令和5年12月28日

提 出 年 月 日　　令和 5年　9月 26日
受　注　業　者　　戸田道路株式会社
現 場 代 理 人　　安村　浩樹

月　日	先週(実施)							今週予定							来週予定							再来週予定							備　考
	9月							10月																				
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
構造物撤去工																													道路拡幅部STEP1
道路土工																													
残土処理工																													現場→仮置場 仮置場→処分地
地盤改良工																													
円形側溝工																													
仮乗入舗装(1)																													店舗出入口部
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工																													切下げ詳細 未確定
3次元出来形管理																													
立会・確認 打合せ等	閉						閉			材料 確認				閉						閉	閉						閉	閉	計画
場所・時間	所						所			11:30遠 隔　臨 場				所						所	所						所	所	実施
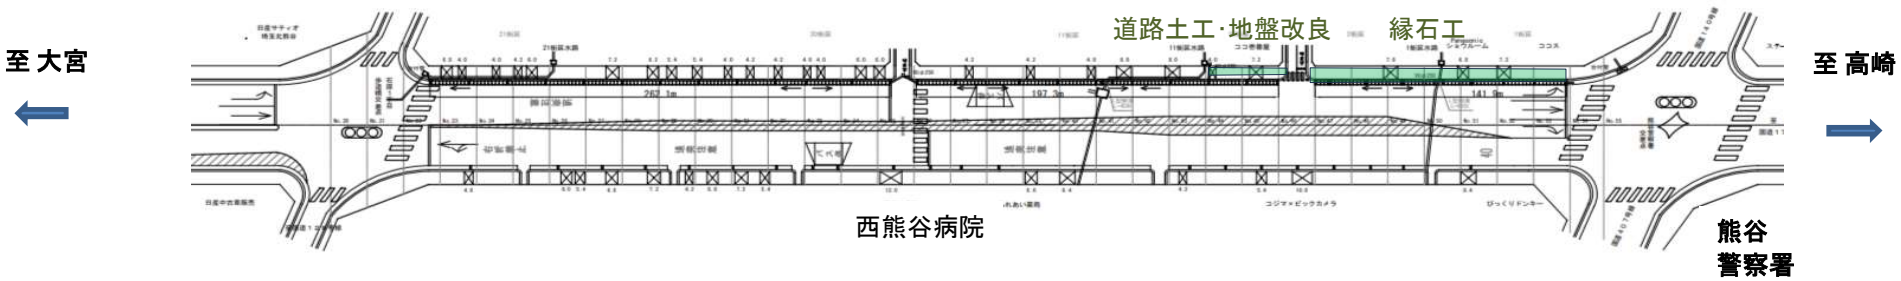
【摘要欄】
